

# 지하수 이용실태조사 조사표

|            |                      |                                    |                  |                           |              |              |              |         |              |              |                                       |         |         |  |
|------------|----------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|---------------------------------------|---------|---------|--|
| 일련번호       | 407                  |                                    | 조사<br>일자         | 1차:                       | 2025년 3월 21일 |              | 조사<br>자      | 한국농어촌공사 |              | 김희중          |                                       |         |         |  |
| 허가<br>번호   | W201010015           |                                    |                  | 2차:                       | 2025년 5월 7일  |              |              | 한국농어촌공사 |              | 김희중          |                                       |         |         |  |
| 관정명        | F-613                |                                    |                  | 3차:                       | 2025년 7월 20일 |              |              | 한국농어촌공사 |              | 김희중          |                                       |         |         |  |
|            |                      |                                    |                  | 4차:                       | 2025년 11월 4일 |              |              | 한국농어촌공사 |              | 김희중          |                                       |         |         |  |
| 소재지        | 관정                   | 위치                                 | 제주시 구좌읍 덕천리 1364 |                           |              |              |              |         |              |              |                                       |         |         |  |
|            | 좌표                   | X:                                 | 175892.1         |                           |              |              | Y:           | 98364.3 |              |              |                                       |         |         |  |
|            | 배수지1                 | 위치                                 | 제주시              | 구좌읍                       | 덕천리          | 1127-8       | 배수지2         |         |              |              |                                       |         |         |  |
| 소유주        | 성명                   | 제주시장                               | 주소               | 제주특별자치도 제주시 광양9길 10(이도이동) |              |              |              |         | 전화           | 064-728-3725 |                                       |         |         |  |
| 시설<br>내역   | 시설년도                 |                                    | 표고               | 굴착심도                      | 케이싱구경        | 토출구경         | 양수능력         | 자연수위    | 안정수위         |              |                                       |         |         |  |
|            | 2012-12-31           |                                    | 261 m            | 310 m                     | 250 mm       | 100 mm       | 800 m³/일     | 215.5 m | 216 m        |              |                                       |         |         |  |
|            | 전력                   | 380 V                              | 펌프               | 규격                        | 제조사          | 모터           |              | 설치심도    | 급수구역         |              |                                       |         |         |  |
|            |                      |                                    |                  |                           |              | 마력           | 제조사          |         | 필지           | 면적(m²)       |                                       |         |         |  |
|            |                      |                                    |                  |                           |              | 60 HP        |              |         | m            |              |                                       |         |         |  |
|            | 이용<br>시설<br>적합<br>여부 | 구분                                 | 상부 보호공 덮개        |                           |              |              | 유량계          |         | 출수장치         |              | 수위측정관                                 |         |         |  |
|            |                      | 적합<br>여부                           | 설치               |                           |              | 미설치          | 설치           |         | 미설치          | 설치           | 미설치                                   | 설치      | 미설치     |  |
|            |                      |                                    | 양호               | 불량                        | 재질           |              | 양호(구경)       | 불량(사유)  |              | (구경)         |                                       |         |         |  |
|            |                      |                                    |                  | ●                         | 철            |              | 100          |         |              | 20           |                                       | ●       |         |  |
|            |                      | 구분                                 | 울타리(웬스)          |                           | 배전반          |              |              | 배수조     |              |              | 저수조<br>배전반실<br>지하수보호공<br>상태<br>(도색여부) |         | 누수상태 부위 |  |
| 적합<br>여부   |                      | 설치                                 | 미<br>설치          | 양호                        | 노후           | 기동방식         | 용량           | 자재      | 형태1          | 형태2          | 배수지 도색 필요                             |         |         |  |
|            | 양호                   | 불량                                 |                  |                           | 리액터          | 인버터          |              |         |              |              |                                       |         |         |  |
| 지하수<br>주용도 | 지하수 사용여부             |                                    | 미사용시 사유          |                           |              | 수질검사 시료채취 장소 |              |         | 수질검사 시료채취 일자 |              |                                       |         |         |  |
|            | 사용                   | 미사용                                |                  |                           |              | 1차           |              | 2차      |              | 1차           |                                       | 2차      |         |  |
|            | ●                    |                                    |                  |                           |              | 출수장치         |              | 출수장치    |              | 05월 14일      |                                       | 11월 05일 |         |  |
| 점검<br>결과   | 1차                   | 관정 출입문 파손                          |                  |                           |              |              | 지하<br>수위     | 1차      | 209.3        |              | 0.0                                   |         | m       |  |
|            |                      | 상부보호시설 덮개 파손                       |                  |                           |              |              |              | 2차      | 208.7        |              | 0.0                                   |         | m       |  |
|            |                      | 전력계 일반 3, 4                        |                  |                           |              |              |              | 3차      | 208.26       |              | 0.0                                   |         | m       |  |
|            |                      | 상부보호시설 덮개 녹슴, 배수지 도색 필요, 울타리 정문 파손 |                  |                           |              |              |              | 4차      | 207.88       |              | 0.0                                   |         | m       |  |
|            | 2차                   | 1122                               |                  |                           |              |              | 유량<br>계<br>측 | 1차      | 140440       |              |                                       |         | m³/일    |  |
|            |                      | 수질검사 시료채수                          |                  |                           |              |              |              | 2차      | 157669       |              |                                       |         | m³/일    |  |
|            |                      | 에어밴드 누수                            |                  |                           |              |              |              | 3차      | 189635       |              |                                       |         | m³/일    |  |
|            |                      |                                    |                  |                           |              |              |              | 4차      | 233840       |              |                                       |         | m³/일    |  |
|            | 3차                   |                                    |                  |                           |              |              | 전력<br>계<br>측 | 1차      | 주간:          | 58,458       | 야간:                                   | 39,367  | KWh     |  |
|            |                      | 보호공 내부 물고임                         |                  |                           |              |              |              | 2차      | 주간:          | 70,768       | 야간:                                   | 47,610  | KWh     |  |
|            |                      | 수질검사 시료채수                          |                  |                           |              |              |              | 3차      | 주간:          | 93,647       | 야간:                                   | 63,770  | KWh     |  |
|            |                      |                                    |                  |                           |              |              |              | 4차      | 주간:          | 126,002      | 야간:                                   | 85,166  | KWh     |  |
|            | 비 고                  |                                    |                  |                           |              |              |              |         |              |              |                                       |         |         |  |


# 지하수관정 실태조사 사진



전 경




근거리

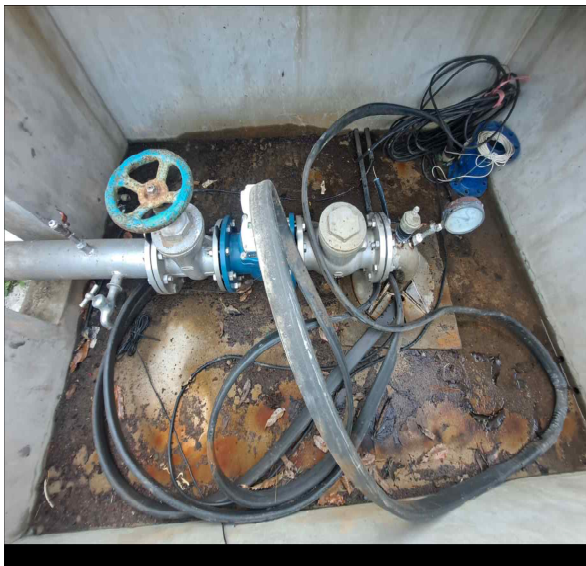


보호시설 내부



유량계

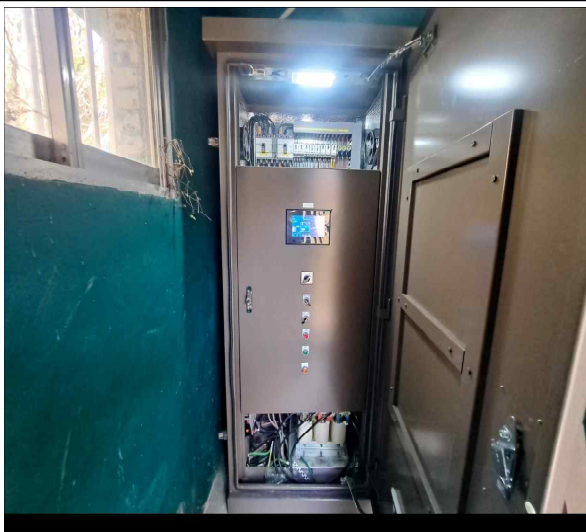

배전반

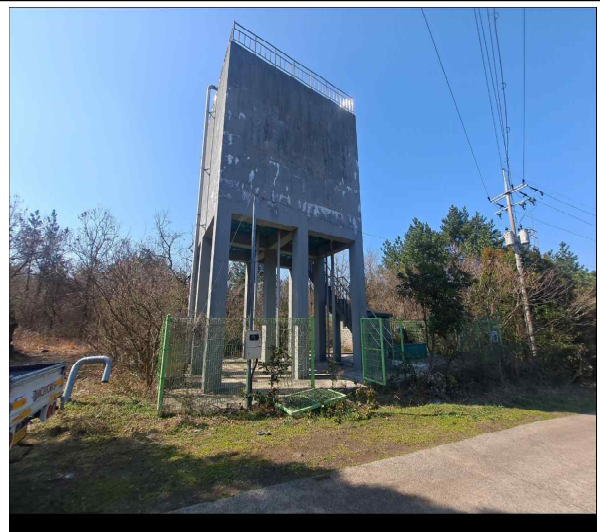

배수구
